MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 649 T/2019

Direccion de Redes Sanitarias y Gas

BR 124 a BR 125 D= Ø 160 Lc= 66.00m P=12.06 ‰
BR 125 a BR 126 D= Ø 160 Lc= 66.00m P=7.27 ‰

Calle : Pública Nº23 de Calle Pública Nº6 a Calle Pública Nº8

Colectora P.V.C. Ø 160mm

N° de Conexiones : 7

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LINEA DE CORDON VEREDA, CON POZO DE 1.00m DE DIAMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.
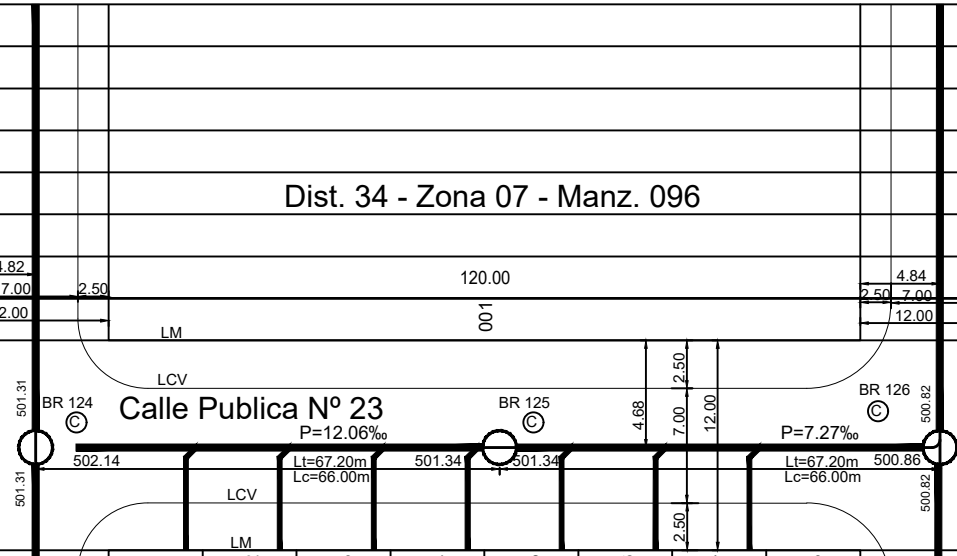
PROF. BAJO VEREDA															
COTA DE TERRENO															
COTA COLECTORA															
DISTANCIA A B.R.															
DIST.-ZONA - MANZ.							Dist. 34 - Zona 07 - Manz. 096								
DIST. CONEX. A MED.															
ANCHO DE PARCELA		4.82 / 2.50 / 7.00		2.50			120.00					4.84 / 2.50 / 7.00		2.50	
N* DE PROP./PARCELA		12.00					001					12.00			
N* DE PROP./PARCELA						001	002	003	004	005	006	007	008		
ANCHO DE PARCELA						24.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	24.00		
DIST. CONEX. A MED.						2.50	2.20	2.50	2.40	2.50	2.50	2.60			
DIST.-ZONA - MANZ.							Dist. 34 - Zona 07 - Manz.111								
DISTANCIA A B.R.			67.20			38,20	25,90	14,20	2,10	0.00 / 67.20	55,30	43,30	31,40		0.00
COTA COLECTORA			502.14			501,14	501,05	500,96	500,88	501.34	501,26	501,17	501,09		500.86
COTA DE TERRENO			503.34							502.53					502.18
PROF. BAJO VEREDA			1.20			1,10	1,10	1,10	1,10	1.19	1,10	1,10	1,10		1.32
